



특 수 공 시

2016년 특수공시 사업내역

○ 2016년 재정운영 결과 지역특성을 고려한 주민관심사항으로

- ▶ 핵심 주요역점사업
- ▶ 재해위험지역 재정지원 결과 등 안전관련 주민 관심사업
- ▶ 다수의 시민과 관련이 있는 사업 등을 선정원칙으로 하여 공시하고자 함.

(단위 : 억원)

연번	부서명	사업명	기간	총사업비	'16까지 투자비	비고
1	시민안전담당관	야전 재해위험지구 정비사업	'13~'17	340	253	
2	시민안전담당관	어은 재해위험지구 정비사업	'14~'18	165	135	
3	시민안전담당관	진기들 재해위험지구 정비사업	'14~'18	265	154	
4	친환경농업과	전주푸드공공급식센터건립사업	'15~'16	25	25	
5	U-20월드컵추진단	전주시 U-20 월드컵경기장 시설보수	'16~'17	120	118	
6	도시재생과	전주 첫 마중길 조성	'15~'17	60	40	
7	시민교통과	화물자동차 공영차고지 조성	'14~'18	123	56	
8	걷고싶은도시과	삼천 생태하천 복원	'11~'17	280	212	
9	걷고싶은도시과	혁신로 확장 (호남제일문~동산고가교)	'08~'17	112	101	
10	문화정책과	덕진예술회관 증축사업	'15~'17	56	34	
11	문화정책과	폐 산업시설 문화재생사업	'16~'17	50	4.5	
12	전통문화유산과	전라감영 재창조 복원공사	'14~'19	109	37	
13	중소기업과	노후산업단지 및 주변공업지역 재생	'10~'20	868	409	
14	환경위생과	전주시 LID그린빛물인프라 조성사업	'15~'19	337	45	
15	덕진 건설과	명성아파트~사평교간 도로확장	'14~'18	54	43	
16	덕진 건설과	삼례교 보수·보강 공사	'17~'19	70	14	
17	덕진 건설과	서곡광장~송천동 신풍리간 중로개설	'07~'19	321	223	

1 야전 재해위험지구 정비사업

목적

- 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 야전지구의 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업 개요

- 위치 : 덕진구 팔복동 야전마을 일원
- 사업규모 : 관로 정비 3.4km, 우수지 설치 1개소, 펌프 5개소 설치 등
- 총사업비 : 34,000백만원(국 16,529, 도 6,538, 시 9,130, 특교 1,803)
 - 기투자 : 25,323백만원(국 12,190, 도 4,803, 시 6,527, 특교 1,803)
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년

□ 추진현황

- 자연재해위험지구 지정 : '10. 02.
 - 유형 : 침수 위험지구(가등급), 지정면적 : 1,560,000m²
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '13. 05. ~ '14. 10.
- 국민안전처 사전설계 심의(2회) : '14. 01. ~ 04.
- 행정절차이행(설계자문위원회 자문, 일상감사 등) : '14. 05.
- 공사 추진(공정 60%) : '14. 06. ~
 - 1~2차분('14~'16년) 준공 : 관로정비 L=1.9km, 펌프 2개소
 - 3~4차분('16~'17년) 추진 : 관로정비 L=0.7km, 펌프 및 우수지 설치

□ 향후계획

- 공사 추진 : ~ '17. 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	34,000	13,323	4,000	8,000	8,677
국 비	16,529	6,662	2,000	4,000	4,339
도 비	6,538	2,665	800	1,600	1,735
시 비	10,933	3,997	1,200	2,400	2,603
기 타					

2

어은 재해위험지구 정비사업

목 적

- 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 어은지구의 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 진북동 어은·도토리골 일원
- 사업규모 : 배수펌프 5개소, 유입관거 1.16km 등
- 총사업비 : 16,500백만원(국 8,250, 도 3,300, 시 4,950)
 - 기투자 : 5,600백만원(국 2,800, 도 1,120, 시 1,680)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

□ 추진현황

- 자연재해위험지구 지정 : '10. 2.
 - 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 416,900m²
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '14. 6.~
- 국민안전처 사전설계 심의 : '15. 2.
- 행정절차이행(설계경제성 검토, 설계자문위원회 심의 등) : '15. 3.~5.
- 공사추진(공정 63%) : '15. 09. ~
 - 1차분('15~16년) 준공 : 배수펌프 설치 2개소, 유입관로 L=0.4km 등
 - 2차분('16~17년) 추진 : 배수펌프 설치 3개소, 유입관로 L=0.7km 등

□ 향후계획

- 연차별 공사 추진 : ~ '18. 10.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	16,500	1,600	4,000	7,900	3,000
국 비	8,250	800	2,000	3,950	1,500
도 비	3,300	320	800	1,580	600
시 비	4,950	480	1,200	2,370	900
기 타					

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 시민안전담당관실 담당자 성명 박중배 (☎063-281-5152)

3 진기들 재해위험지구 정비사업

목 적

- 집중호우 시 전주천 수위상승으로 홍수위보다 낮은 진기들지구의 침수피해를 예방하여 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 전미동2가 1615-1번지 일원
- 사업규모 : 펌프장 설치 1개소, 우수지 설치 1개소, 배수로 개선 2.1km 등
- 총사업비 : 26,500백만원(국 13,250, 도 5,300, 시 7,950)
 - 기투자 : 15,430백만원(국 7,715, 도 3,086, 시 4,629)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

□ 추진현황

- 자연재해위험지구 지정 및 관리 : '10. 02.
 - 유형 : 침수위험지구(가등급), 지정면적 : 3,633,400m²
- 기본 및 실시설계용역 추진 : '14. 06. ~ '15. 06.
- 사전설계 심의(국민안전처) : '15. 07.
- 행정절차이행(설계자문위원회 심의, 계약심의 등) : '15. 10. ~ 11.
- 공사추진(공정 32%) : '16. 01. ~
 - 1차분('16~'17년) 추진 : 배수펌프 및 우수지 등 설치
- 편입토지(우수지) 수용재결 절차 이행 : '16. 06. ~10.

□ 향후계획

- 연차별 공사 추진 : ~ '18. 11.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	26,500	2,800	4,000	8,630	11,070
국 비	13,250	1,400	2,000	4,315	5,535
도 비	5,300	560	800	1,726	2,214
시 비	7,950	840	1,200	2,589	3,321
기 타					

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 시민안전담당관실 담당자 성명 박승원 ☎063-281-2154

4

전주푸드 공공급식센터 건립사업

목 적

- 시민의 지역먹거리 접근성 제고를 통한 지역농산물 신뢰 및 안전성 구축으로 어린이, 취약계층, 학생 등에게 공급할수 있는 시설 기반 마련

□ 사업 개요

- 기 간 : 2015. 8월 ~ 2016. 12월
- 위 치 : 전주시 덕진구 월드컵경기장 구 견인차보관소(장동 531-8)
- 규 모 : 내부 리모델링공사 1식(면적 1,760.21m²)

□ 추진현황

- 전주푸드 공공급식센터 지특 공모사업 선정 : '15. 8.
- 전주푸드 공공급식센터 지방재정투융자심사(시) : '15. 11.
- 실시시설계약 계약 및 착수 : '16. 3.
- 사전행정절차 이행(일상감사, 원가심사 등) : '16. 5.~6.
- 공사 입찰공고 및 착공 : '16. 7.
- 공사준공 : '16. 10. 21.
- 운영에 필요한 물품구입(주방설비기기, 저온저장고 등) : '16. 11.~12.

□ 향후계획

- 공공급식지원센터 운영(복지시설, 공공기관, 학교 등) : '16. 11.~

□ 연도별 투자계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	2,500			2,500	
국 비	1,250			1,250	
도 비					
시 비	1,250			1,250	
기 타					

□ 위치도



□ 현장사진

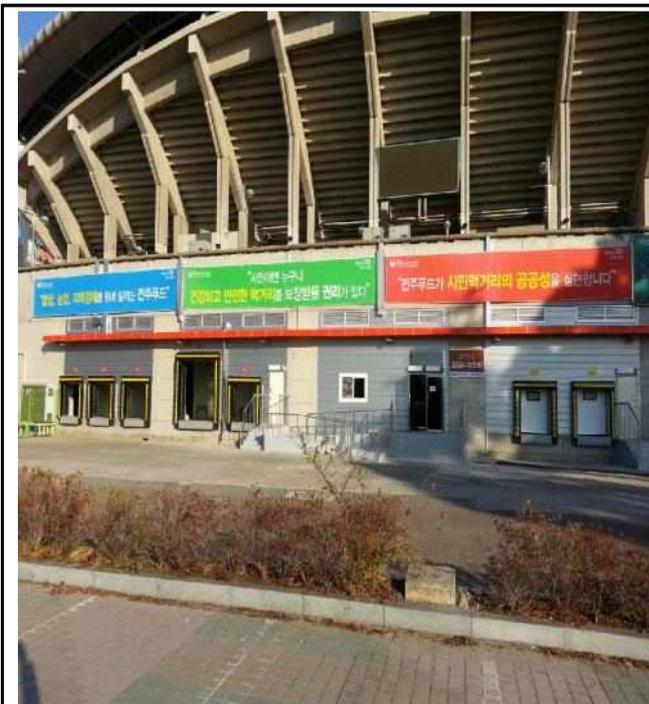

전경사진



내부사진

* 담당부서 : 친환경농업과 담당자 성명 송 세 계(☎063-281-2151)

5 FIFA U-20 월드컵경기장 시설정비

목 적

- 『FIFA U-20 월드컵 코리아 2017』 개최에 따른 전주월드컵경기장의 주요시설을 차질 없는 정비로 대회 준비 및 시민 편의 증진 도모

□ 사업 개요

- 기 간 : '16. 3. ~ '17. 5.
- 사 업 비 : 12,023백만원(국 930, 특 1,500, 도 2,000, 시 7,593)
 - 2017년 : 200백만원
- 사업내용 : 전주월드컵경기장 노후 시설 개·보수
 - FIFA 시설기준 충족 및 선수단 운영본부 등 내부 정비
 - 경기장 3층 관중석 바닥정비 및 신축이음(E·J) 보수
 - 천연 잔디 교체 및 주변도로·주차장 정비 등
 - 전광판 교체(주, 보조, 동측) 및 필드조명·전기·기계설비 보수 보강
 - 음향·통신 및 네트워크 보수 보강 등

□ 추진현황

- 사업 준공(2017. 5월) 후 대회 개최 완료

□ 향후계획


- 전주시설공단에 시설 인계 후 프로축구단(전북현대) 홈구장 활용

□ 연도별 투자계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	12,023			11,823	200
국 비	2,430			2,430	-
도 비	2,000			2,000	-
시 비	7,593			7,393	200
기 타					

□ 위치도

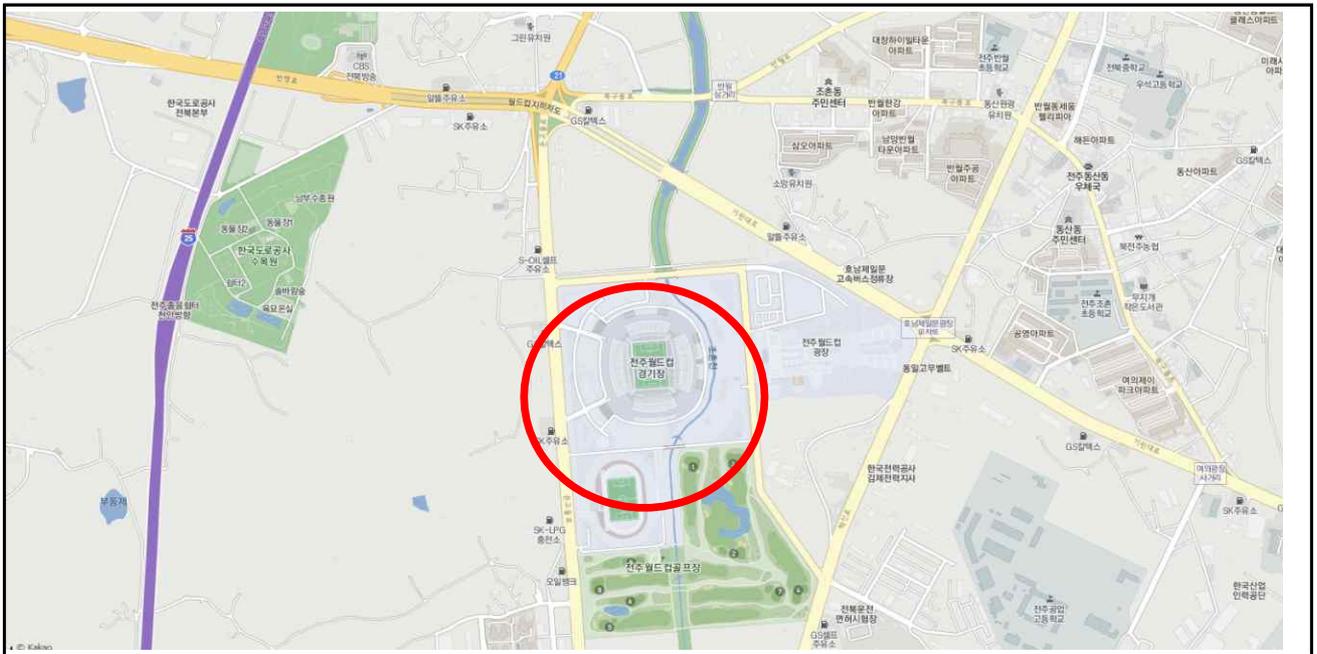

□ 현장사진

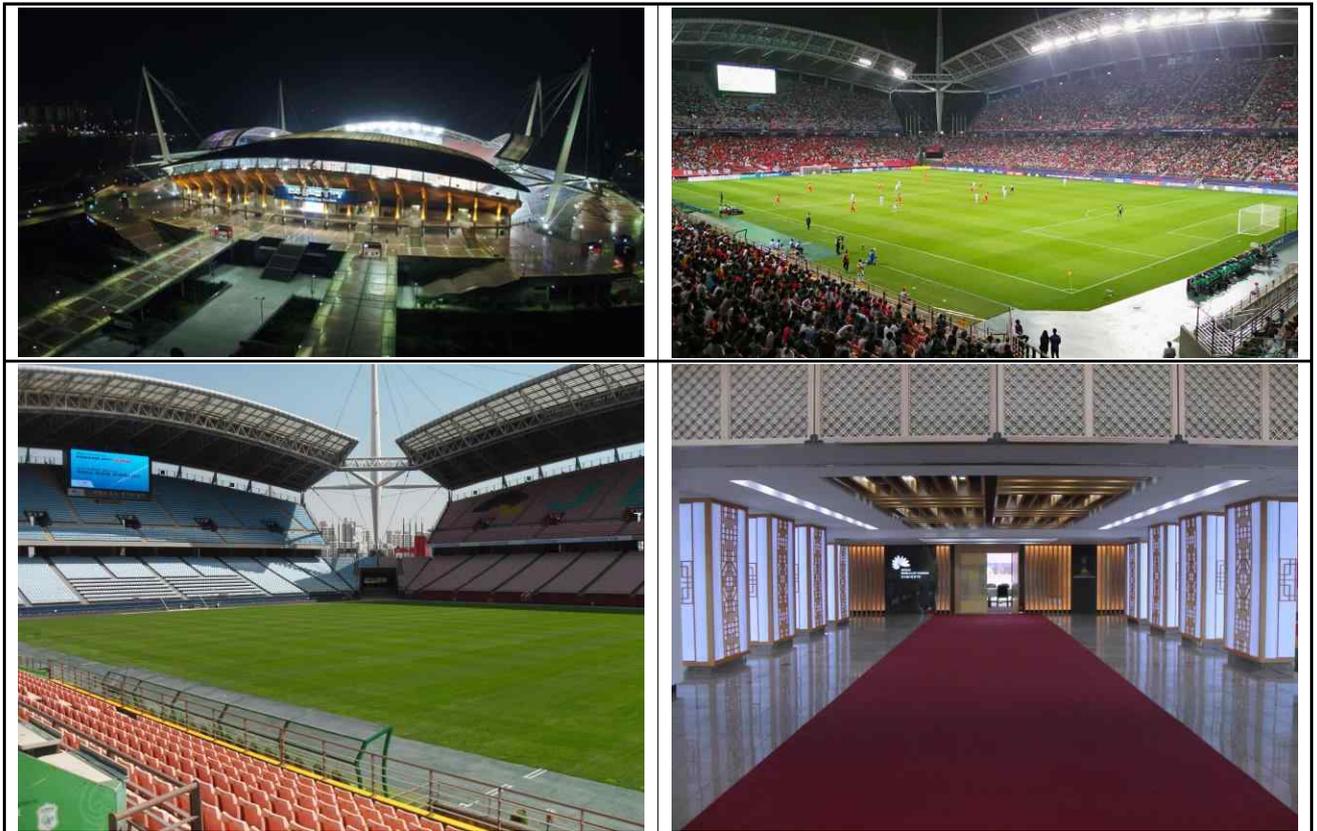

*** 담당부서 : U-20월드컵추진단 담당자 성명 장희광 (☎063-281-6682)**

6 전주 첫 마중길 조성

목 적

- 전주 관광객 천만명 시대를 맞이하여 전주역 앞 백제대로를 보행중심의 명품 특색거리로 조성하여 전주를 찾는 첫 인상을 부각시키고, 침체되어 있는 역세권 경제를 활성화하고자 함

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 백제대로(전주역광장 ~ 명주골사거리)
- 사업기간 : '15년 ~ '17년(3개년)
- 사업비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 2,600, 특교 400)
- 사업내용 : 명품 가로숲길 조성 850m(폭 50m)
 - 중앙 보행광장 조성 720m(폭 15~20m)
 - 수목 식재 400주(느티R25 230주, 이팝 170주), 편의시설 설치
 - 승강장 설치 3개소, 게비온의자 25개, 상징고목 2주 등

□ 추진현황

- '16년 도시숲 조성사업 공모 선정(산림청) : '15. 5. 20.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '15. 6~12월
- 공사 추진(전체공정 95%) : '16. 4월~현재
 - 인도정비 및 아스콘 포장 완료, 수목식재 400주
 - 중앙광장부 경계석 및 판석포장, 안전휀스 설치 완료
 - 예술이 있는 승강장, 게비온 의자, 현수표지판 등 설치 완료
- 시민희망나무 현수(125건/164백만원) : '17. 5월

□ 향후계획

- 첫 마중길 조성공사 전체 준공 : '17. 12월
 - 편의시설 및 상징고목 식재

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2016	2017	2018이후
계	6,000		4,034	1,966	
국 비	3,000		1,034	1,966	
도 비					
시 비	2,600		2,600		
기 타	400		400		

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 도시재생과

담당자 성명 임 정 빈 (☎063-281-2075)

7

화물자동차 공영차고지 조성

목 적

- 화물자동차의 이면도로 및 밤샘 불법주정차를 차단하고 건전한 교통 문화 분위기 조성
물류거점 확보로 화물운송사업 경쟁력 강화

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 장동유통단지 내 화물터미널부지(장동유통로 12)
- 사업기간 : '14년~'18년(5개년)
- 사업규모 : 41,680㎡(주차대수 350대, 관리동 및 휴게시설 등 500평)
- 총사업비 : 123억원(토지매입 82억원, 시설비 41억원)

□ 추진현황

- 중기지방재정계획반영 및 지방재정 투융자 조건부 승인 : '13. 8.~'14. 7.
- 화물자동차 공영차고지 조성계획 수립 : '14. 10. 17.
- 지방재정 투융자 조건부 승인 : '14. 7. 16.
- 화물차 공영차고지 효율적인 운영관리방안 연구용역 : '15. 8. 26.
- 토지매입 계약체결(3개년 분할납부) : '15. 5.~'17. 11.
- 공영차고지 용지매입비 조기 완납 (총 80억원) : '17. 6.

□ 향후계획

- 공영차고지 실시계획인가 및 실시설계 : '17. 8.~
- 공영차고지 공사 착공 및 완료 : '18. 3.~12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	12,300		2,790	2,800	6,710
국 비	4,380		1,120	1,000	2,260
시 비	7,920		1,670	1,800	4,450

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 시민교통과

담당자 성명 김영식 (☎063-281-2361)

8

삼천 생태하천 복원사업

목 적

- 생물종 중심의 생태하천복원으로 깃대종(반딧불이) 서식처 조성과 시민들에 쾌적한 생활환경 제공
- 생명이 살아숨쉬는 맑고 깨끗한 하천 조성하여 주민 친수공간 확보

□ 사업 개요

- 위 치 : 전주시 평화동 원당교 ~ 서신동 전주천 합류점
- 사업규모 : 생태하천복원 L=9.8km
- 총사업비 : 28,000백만원(국비 19,600 / 시비 8,400)
- 사업기간 : 2011 ~ 2017년(6개년)
- 사업내용 : 깃대종(반딧불이) 복원, 수달 보금자리 조성 등

□ 추진현황

- 환경부 깃대종 복원 시범사업 선정 : '10. 7월
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '11. 11월
- 실시설계 기술 검토(새만금환경청) : '11. 11월
- 생태하천복원심의회 심의(전라북도) : '13. 10월
- 공사 착공(공정 83%) : '13. 12월
 - 호안조경 쌓기 : 1.8km · 산책로 정비 2.1km
 - 보 철거(2개소) 및 개량(1개소) · 반딧불이 서식처 조성 1식

□ 향후계획

- 연차별 공사 추진 : '17. 1월 ~ '17. 12월
 - '17년 주요계획 : 반딧불이 서식처 조성, 수달보금자리 조성 1식

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	28,000	11,921	4,468	4,867	6,744
국 비	19,600	8,344	3,126	3,407	4,723
도 비					
시 비	8,400	3,577	1,342	1,460	2,021
기 타					

9

혁신로(호남제일문~동산고가교) 확장

목적

- 동산동 및 조촌동 일대 유동인구 증가에 따른 교통체증 해소
- 도로확장 및 보행환경 개선사업 추진으로 지역주민 숙원인 안전한 보행로 확보 해결

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 여의동 호남제일문 ~ 반월동 동산고가교
- 사업기간 : 2008년 ~ 2017년 (10개년)
- 사업비 : 11,200백만원(보상비 4,400, 공사비 6,800)
- 사업규모 : 연장 1,000m, 폭 18.5m → 35m

□ 추진현황

- 실시설계 완료 : '14. 12월
- 호남제일문~반달회관(연장 500m) 확장공사 완료 : '15. 11월
- 반달회관~동산고가교(연장 500m) 확장공사 완료 : '16. 12월
- 전구간 가로수 식재 및 잔여구간 공사 추진 : '16. 12월
- 조경공사 및 전기공사(신호등 포함) 완료 : '17. 04월

□ 향후계획

- 편입토지 보상 완료 : '17. 07월
- 전체공사 완료 : '17. 08월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	11,200	4,700	1,000	4,400	1,100
국 비					
도 비					
시 비	11,200	4,700	1,000	4,400	1,100
기 타					

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 걷고싶은도시과 담당자 성명 강종열 (☎063-281-2452)

10 덕진예술회관 증축

목 적

- 시립예술단의 역량강화를 위한 연습실 등 공간 확충을 실시하여 예술단의 창작여건을 강화하고 시민의 다양한 문화예술 수요 충족

□ 사업 개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년
- 위 치 : 전주시 덕진구 권삼득로 407(예술회관 부지 내)
- 규 모 : 연면적 2,500m²(지하1층, 지상 3층)/공연장·연습장(마루형) 및 사무실

□ 추진현황

- 건축설계용역(171백만원) : '15. 6. ~ '16. 7.
- 건축허가 및 도시계획실시계획인가 : '16. 7.
- 덕진예술회관 착공 : '16. 9.

□ 향후계획

- 덕진예술회관 증축 준공 : '17. 9.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	5,600		200	3,200	2,200
국 비	2,000			1,280	7,20
도 비					
시 비	3,600		200	1,920	1,480
기 타					

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 문화정책과

담당자 성명 류성훈 (☎063-281-5128)

11 폐 산업시설 문화재생사업(팔복예술공장 조성)

목적

지역예술인과 주민을 위한 문화플랫폼을 구축하고, 문화소외지역인 팔복동 산단 내에 새로운 문화생산 및 문화향유 거점공간으로서의 복합문화공간으로 조성

□ 사업 개요

- 사업대상 : 덕진구 구렛들 1길 46(팔복동, 구 쏘렉스)
- 기 간 : '16. 1. ~ '17. 11.
- 총사업비 : 50억원(국비 25, 시비 25)
- 내 용 : 폐 산업시설을 활용한 다목적 복합문화공간 조성
 ※ 금학천 정비(걸고싶은도시과), 철길주변 도로정비사업(중소기업과)와 연계 추진

□ 추진현황

- 2016년 산업단지 폐산업시설 문화재생 공모 선정 : '15. 10.
- 사업대상 물건 임대차 계약 체결 : '16. 4. 15.
- 기본계획 수립을 위한 시범프로그램 운영 : '16. 7. ~ 12.
- 기본계획 수립 및 건축설계용역 추진 : '16. 12. ~ '17. 6.
- 도시공원위원회 및 경관위원회 자문 : '17. 3. ~ 4.
- 리모델링 건축공사 착공 : '17. 6. 23.

□ 향후계획

- 기본운영계획(안) 마련 : '17. 8월
- 건축공사 완료 및 팔복예술공장 개관 : '17. 11월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	5,000			450	4,550
국 비	2,500			225	2,275
도 비					
시 비	2,500			225	2,275
기 타					

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 문화정책과

담당자 성명 송 경 호 (☎063-281-2680)

12 전라감영 재창조 복원공사

목 적

- 조선시대 전라남·북도 및 제주도를 관할하던 정치, 행정, 문화, 군사의 중심지인 전라감영을 복원하여 전북도민의 자존감을 높이고 한옥마을과 풍패지관 등을 연결하는 관광축을 구성하여 구도심 활성화에 기여

□ 사업 개요

- 위 치 : 전주시 완산구 전라감영로 57(구도청사)
- 사업면적 : 16,117.1m² (금회사용 : 8,482.9m²)
- 사업내용 : 감영시설 복원 및 실감형 콘텐츠 체험장 조성
- 선화당, 내아, 관풍각, 내삼문, 비장청, 연신당 등

□ 추진현황

- 전라감영 복원 재창조위원회 발족 : '14. 12.
- 구)전라북도청사(본관동,의회동,경찰청동) 철거 완료 : '16. 3.
- 전라감영지 문화재 발굴조사(9,115m²) : '16. 11.
- 전라감영 실시설계 용역 완료 : '17. 5.

□ 향후계획

- 건축공사 발주 : '17. 7.
- 전라감영 재창조 복원공사 착수 : '17. 8.
- 전라감영 재창조 복원 및 실감형 콘텐츠 체험공간 조성 : '19. 3.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	10,940	1,100	1,040	1,580	7,220
국 비	0	0	0	0	0
도 비	4,960	550	260	540	3,610
시 비	5,980	550	780	1,040	3,610
기 타	0	0	0	0	0

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 전통문화유산과 담당자 성명 이 수호 (☎063-281-5357)

목 적

- 도로, 주차장 등 기반시설 확충으로 기업환경 및 근로환경 개선
- 친환경 첨단업종으로 개편하여 고부가가치 창출 및 기업경쟁력 강화

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 팔복동 제1산업단지 일원
- 사업규모 : 산단재생 1,806천m²
- 사 업 비 : 868억원(국비 295, 시비 573)
- 사업기간 : 2010 ~ 2020(11년)

□ 추진현황

- 노후산단 재생사업 우선 사업지구 선정(전주,대전,대구,부산) : '09. 9. 3.
- 재생사업지구 지정 및 재생계획 고시 : '12. 6. 25.
- 재생계획(변경) 및 재생시행계획 승인/고시 : '15.11.12. / 18.
- 팔과정로(대로 1-1) 신설 및 확장공사 착수(공정 53%) : '16. 6. 3.
- 지원·주거시설 용지 내 도로편입용지 보상 착수(보상율 94%) : '16. 9. 26.

□ 향후계획


- 팔과정로(대로 1-1) 개설공사 추진(L=1.4km) : '16. 6. ~ '18. 6.
- 팔복동 철길명소화사업 공사추진 : '17. 9. ~ '18. 12.
- 지원 및 주거시설용지 도로 개설추진 : '18. ~ '19.
- 공원·주차장 등 잔여구간 사업추진 : '19. ~ '20.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	868	129	180	100	459
국 비	295	97	75	50	73
시 비	573	32	105	50	386

□ 위치도

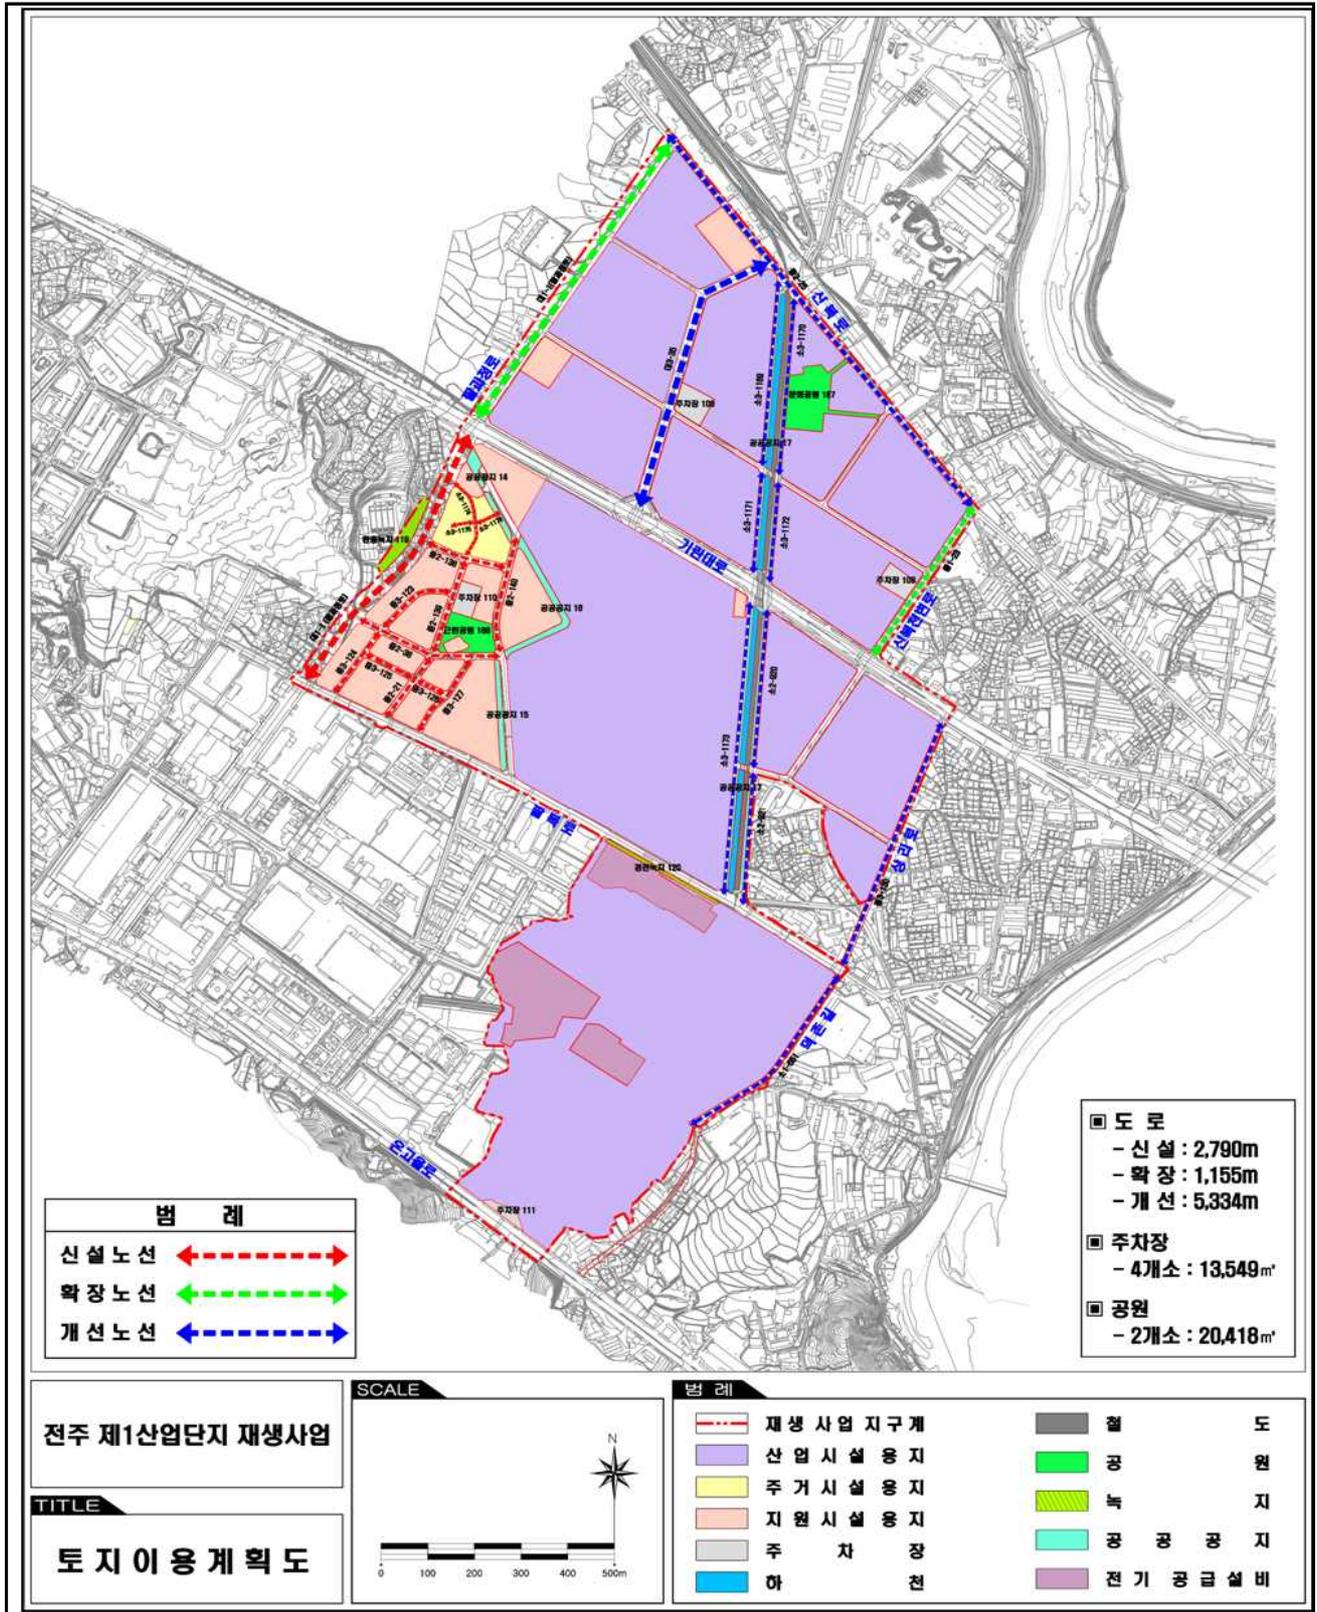

* 담당부서 : 중소기업과 담당자 성명 전 성 일 (☎063-281-5122)

목 적

- 우수의 침투, 저류 등 물순환 체계를 개선하는 시설 및 환경 구축으로 강우 유출량 저감 및 수생태계 건강성 향상

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진공원 유역 3.77km²(덕진동1가, 금암동, 인후동2가 일원)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년(5년)
- 총사업비 : 337억원(국비 70%, 시비 30%)
- 사업내용
 - 빗물의 땅속 투수향상을 위한 LID시설(식생체류지, 투수성포장 등) 설치

□ 추진현황

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '15. 9. ~
- 기본계획 설명회(환경부) : '16. 4. 7.
- 용역 일시정지(설계 환경부 승인 등 절차 이행) : '16. 11. 7.
- 설계 경제성 검토용역 완료 : '16. 12. 30.
- 설계 환경부 승인 신청 및 보완(2회) : '16. 11. 8. ~

□ 향후계획

- 설계 환경부 승인 : '17. 7.
- 설계 원가심사 등 행정절차 이행 : '17. 7. ~ 8.
- 공사추진 : '17. 9. ~ '19.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	33,757		1,511	3,010	29,236
국 비	23,630		906	1,820	20,904
도 비					
시 비	10,127		605	1,190	8,332
기 타					

□ 위치도



* 담당부서 : 환경위생과

담당자 성명 권재명 (☎063-281-5149)

목적

- 하가지구쪽은 폭 20m로 개설되었고 사평교쪽은 확장되지 않아 병목현상으로 도심지 간선도로 교통체증 발생

□ 사업 개요

- 위 치 : 덕진구 명성강변아파트 ~ 사평교(법원로)
- 사업규모 : 도로개설 L=285m, B=12m → 20m (중로 1-3)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사 업 비 : 5,400백만원(기 확보 4,300, 잔여 1,100)

□ 추진현황

- 도시관리계획 변경결정 및 고시 : '15. 09.
- 토지 및 지장물 분할, 감정평가 : '15. 10. ~'16. 08.
- 토지 및 지장물 보상협의 : '15. 12. ~ 계속
- 10필지, 1,127㎡(24필지 2,350㎡중 14필지, 1,223㎡ 완료)
- 기본 및 실시설계용역 : '16. 08. ~ 11.

□ 향후계획

- 용지 및 지장물 보상 협의(10필지, 1,127㎡) : '17. 01. ~ 계속
- 추경 예산확보후 공사 추진 : '17. 10. ~'18. 11.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	5,400	760	-	3,540	1,100
시 비	5,400	760	-	3,540	1,100

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 덕진 건설과 담당자 성명 강 미 진 (☎063-270-6487)

삼례교 보수·보강공사

목 적

- 삼례교는 전주시와 익산시를 연결하는 교량으로 지속적인 교면손상, 편칭 파괴 등이 빈번하여 통행 차량의 대형사고 위험이 많아 교량의 효용증진 및 공중의 안전을 확보하기 위한 보수·보강공사가 시급

□ 사업 개요

- 위 치 : 전주시 덕진구 화전동 삼례교 일원
- 사업규모 : 슬래브 및 교면보수 12,540㎡ 등
- 사업비 : 70억원(국비 27, 시비 43)
 - 확보액 14억원(국비 7, 시비 7)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)

□ 추진현황

- 보수공사 특별교부세 확보(7억) : '16. 11.
- 전주시 지방재정투자심사 가결 : '17. 4.

□ 향후계획

- 삼례교 보수보강공사 실시설계용역 추진 : '17. 6. ~ 9.
- 삼례교 국비확보 지속적 노력(국비 20억, 시비 36억) : 지속
 - ▣ 국비지원 불가시 시비 추경예산 확보 후 공사 추진(10억원)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	7,000			1,400	5,600
국 비	2,700			700	2,000
시 비	4,300			700	3,600

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 덕진 건설과 담당자 성명 신한규 (☎063-270-6488)

목 적

- 북부권 서남과 연결도로로 출퇴근시간 교통체증 가중화에 따른 불편해소 및 추천대교 ~ 송천동 신평리간 도로개설이 완료됨에 따라 교통량 증가로 시민불편 호소 및 조기 개설 민원 다수 발생

□ 사업 개요

- 위 치 : 서곡광장~추천대교~송천동 신평리
- 사업규모 : 도로개설 L=2.78km(교량1기 203m포함), B=20m
- 1공구 : L=1.24km(교량 1기 203m) / 2공구 : L=1.54km
- 사업기간 : 2007년 ~ 2019년
- 총사업비 : 321억원[1공구:181(완료), 2공구:140(기투자 42, '17년 30, 잔여 68)]

□ 추진현황

- 기본 및 실시설계용역 : '07. 12. ~ '09. 12.
- 1공구 공사 완료(추천대교~신평교) : '10. 1. ~ '14. 5.
- 도로확장(L=1.24km, B=20m), 교량1기 203m, 조형물 8개(H=6~10m)
- 2-1공구(L=215m) 공사 완료 : '14. 7. ~ '15. 6.
- 도시계획시설결정(변경) 및 지형도면 고시 : '16. 10.
- 용지 및 지장물 보상 협의 : '17. 2. ~ 계속
- 26필지, 5,880㎡(53필지, 9,098㎡ 중 27필지, 3,218㎡ 완료)
- 보상 완료된 빈집(12동) 철거 : '17. 4. ~ 7.

□ 향후계획

- 용지 및 지장물 보상 협의(26필지, 5,880㎡) : 계속
- 추경 예산확보후 잔여구간(L=1.32km) 단계별 공사 : '17. ~'19.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2015	2016	2017이후
계	32,100	19,800	1,500	1,000	9,800
시 비	27,150	19,350	-	1,000	6,800
기 타	4,950	450	1,500	-	3,000

□ 위치도



□ 현장사진



* 담당부서 : 덕진 건설과 담당자 성명 박 미 리 (☎063-270-6487)
